

Ход реализаций
концессионных соглашений о
проектировании, строительстве
и эксплуатации
общеобразовательных школ в
г. Новосибирске


2023 год.

«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по. ул. Пролетарская в Октябрьском районе г. Новосибирска»



Наименование	Показатель
Вместимость	1 100 мест
Количество этажей	4 этажа
Общая площадь здания	15 977 кв.м
Концедент	Министерство Образования Новосибирской области
Концессионер	ООО «Тридцать пятая концессионная компания «Просвещение»

Текущий статус объекта «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Пролетарская в Октябрьском районе г. Новосибирска»

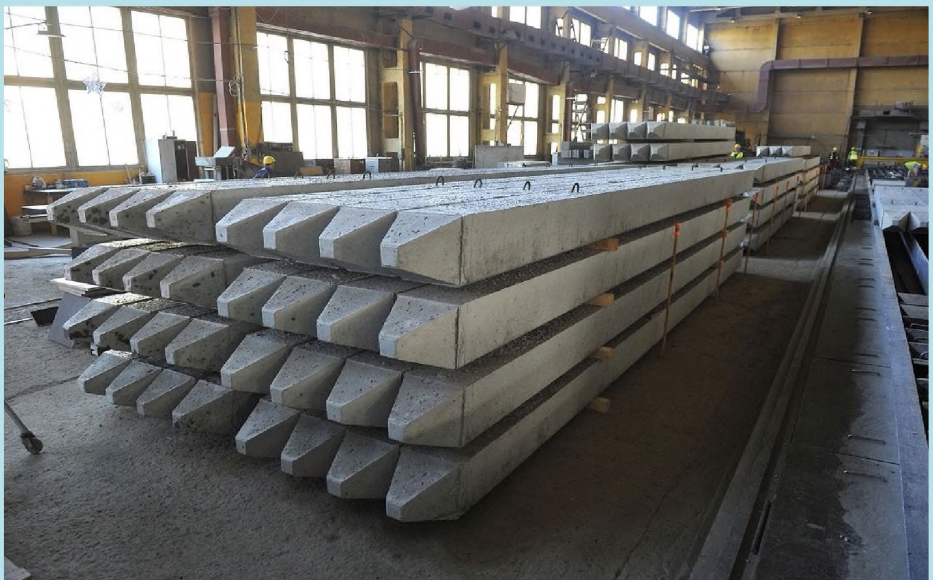

Разрешительная документация

Заключение государственной экспертизы (планируемый срок получения) 20.03.2023
86,1 % готовности

Разрешение на строительство (планируемый срок получения) 05.04.2023

Извещение о начале строительства (планируемый срок получения) 10.04.2023

Программа проверок (планируемый срок получения) 26.04.2023

Стоимость по концессионному соглашению 1 321 153 371

ООО «ЖБИ-5»
Кол - во изделий – 5 500 шт.

Недостающие исходные данные

1. Не осуществлен вынос транзитного кабеля с участка застройки принадлежащий АО «РЭС»

