
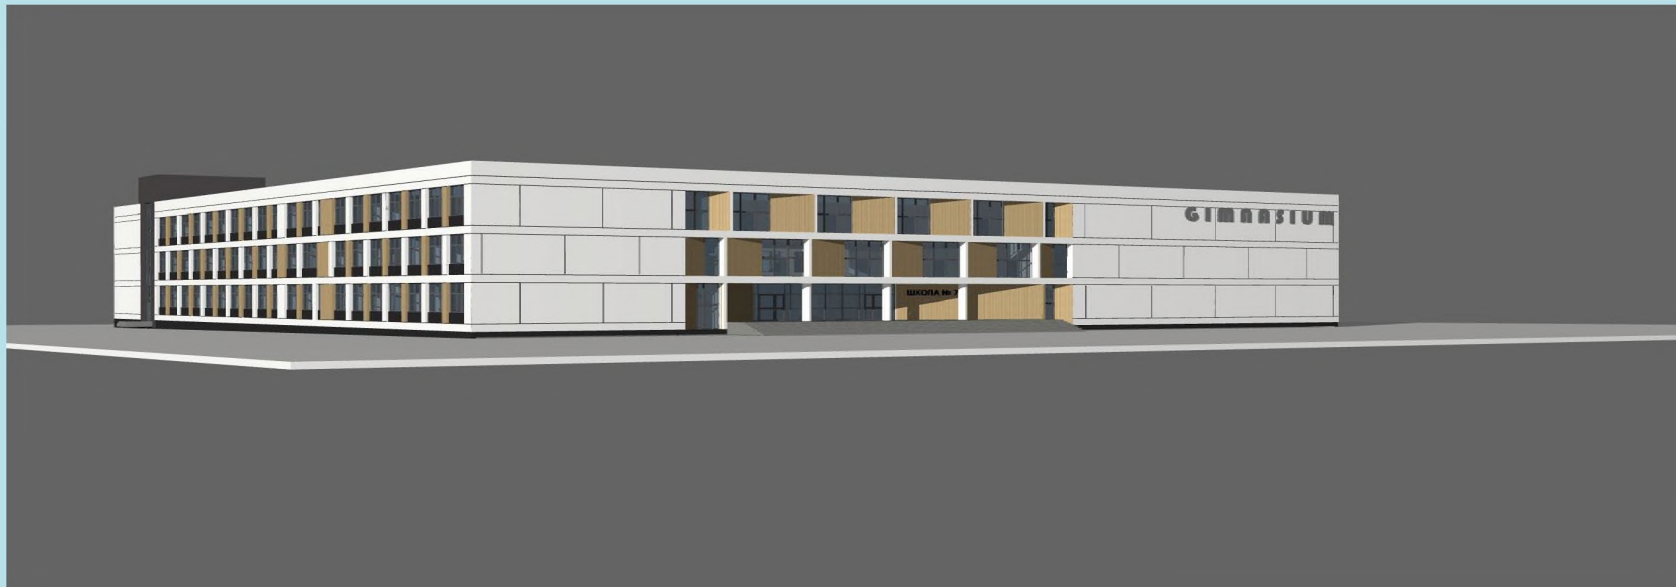


Ход реализаций
концессионных соглашений о
проектировании, строительстве
и эксплуатации
общеобразовательных школ в
г. Новосибирске

2023 год.

«Объект образования (общеобразовательная школа на 550 мест) по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска»

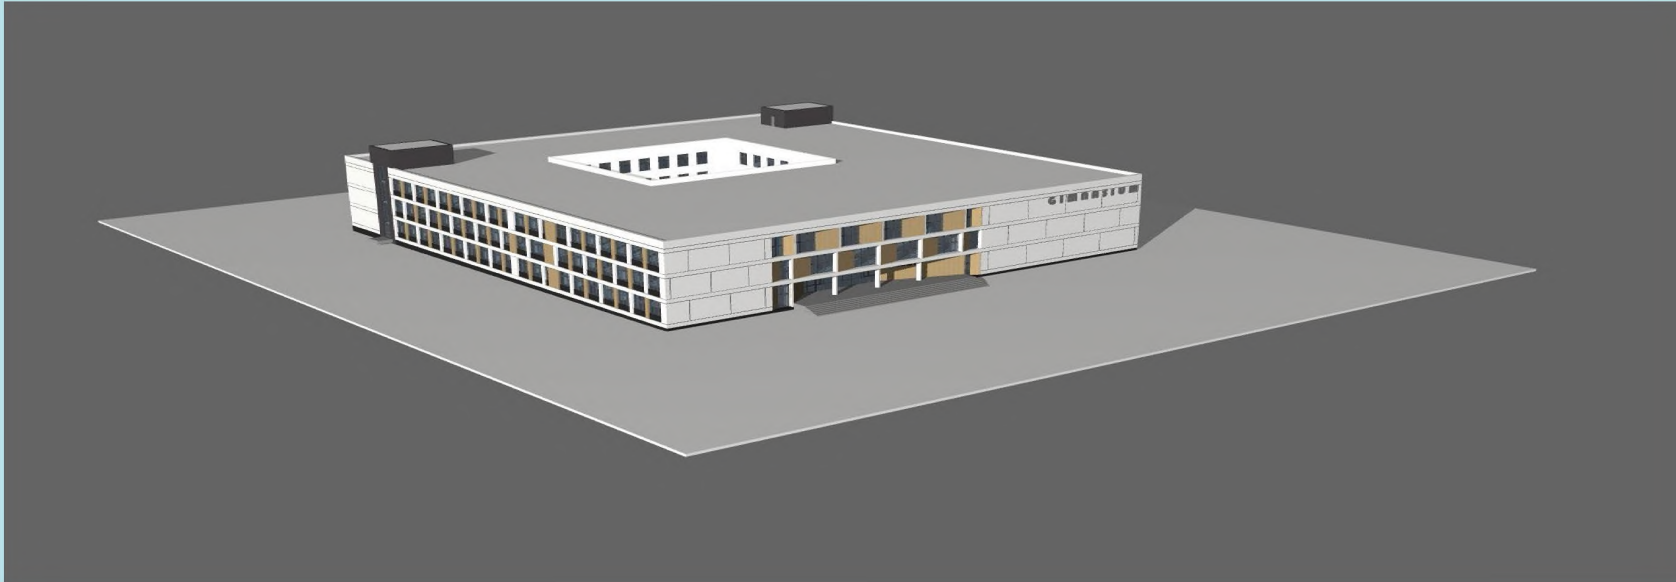

Наименование	Показатель
Вместимость	550 мест
Количество этажей	3 этажа
Общая площадь здания	10 574,6 кв.м
Концедент	Министерство Образования Нижегородской области
Концессионер	ООО «Тридцать третья концессионная компания «Просвещение»

Текущий статус объекта «Объект образования (общеобразовательная школа на 550 мест) по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска»



Разрешительная документация

Заключение государственной экспертизы (планируемый срок получения) 31.03.2023
80,3 % готовности

Разрешение на строительство (планируемый срок получения) 14.04.2023

Извещение о начале строительства (планируемый срок получения) 19.04.2023

Программа проверок (планируемый срок получения) 26.04.2023

Стоимость по концессионному соглашению 772 923 054

ООО "Завод ЖБИ Первомайский"
Кол – во изделий – 4 385 шт.

Недостающие исходные данные

1. Не выделена первая категория технических условий АО «РЭС» письмо №12-33ККП-ГО/03/2023 направлено 09.03.2023г.

2. Не выданы ТУ на пожаротушение МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» письмо №10-33ККП-ГО/03/2023 направлено 01.03.2023г.

